


ID	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Nomes de Recursos	Predecessoras
0		<b>Alteração da Ciclovía na Almirante Reis e ruas envolventes</b>	<b>83,5 dias</b>	<b>Seg 30/05/22</b>	<b>Qua 28/09/22</b>		
1		<b>Implementação da nova ciclovía</b>	<b>60,5 dias</b>	<b>Seg 30/05/22</b>	<b>Sex 26/08/22</b>		
2		<b>FASE 1</b>	<b>21 dias</b>	<b>Seg 06/06/22</b>	<b>Qui 07/07/22</b>		
3		Pintura Buffer + linha interior	1 dia	Seg 06/06/22	Seg 06/06/22	Viamarca	
4		Relocalização segregadores - via descendente	20 dias	Ter 07/06/22	Qui 07/07/22	Viamarca	3
5		<b>FASE 2</b>	<b>60,5 dias</b>	<b>Seg 30/05/22</b>	<b>Sex 26/08/22</b>		
6		<b>Parecer do Metro</b>	<b>0 dias</b>	<b>Seg 30/05/22</b>	<b>Seg 30/05/22</b>		
7		<b>Troço 9 - Alameda Dom Afonso Henriques (central + ilha norte)</b>	<b>17,5 dias</b>	<b>Seg 06/06/22</b>	<b>Seg 04/07/22</b>		
8		Demolição do separador	3 dias	Seg 06/06/22	Qua 08/06/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	6II+5 dias
9		Execução de 3 maciços, caixas e valas SLAT	3 dias	Qui 09/06/22	Qua 15/06/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	8
10		Execução do novo separador	8 dias	Ter 14/06/22	Sex 24/06/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	9II+1 dia
11		Pavimentação em betuminoso	1 dia	Seg 27/06/22	Seg 27/06/22	Alves Ribeiro - Betuminosos:10	
12		Execução de calçadas	3 dias	Qui 23/06/22	Seg 27/06/22	Alves Ribeiro - Calçadas	10CC+1 dia
13		Pré-marcações	0,5 dias	Ter 28/06/22	Ter 28/06/22	Viamarca	11
14		Pintura buffer	1 dia	Ter 28/06/22	Qua 29/06/22	Viamarca	13
15		Montagem de equipamentos SLAT	3 dias	Sex 24/06/22	Ter 28/06/22	Soltráfego	9CI+5 dias
16		Demolição da ilha norte	2 dias	Qua 29/06/22	Qui 30/06/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	15
17		Pavimentação da zona da ilha norte	1 dia	Sex 01/07/22	Sex 01/07/22	Alves Ribeiro - Betuminosos:16	
18		Relocalização segregadores - sentido descendente	3 dias	Qua 29/06/22	Seg 04/07/22	Viamarca	14
19		<b>Troço 9 - Alameda Dom Afonso Henriques para Almirante Reis (zona sul)</b>	<b>10 dias</b>	<b>Seg 27/06/22</b>	<b>Sex 08/07/22</b>		
20		Demolição do início do separador	3 dias	Seg 27/06/22	Qua 29/06/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	10
21		Execução do novo topo do separador	5 dias	Qui 30/06/22	Qua 06/07/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	20
22		Pavimentação em betuminoso	1 dia	Qui 07/07/22	Qui 07/07/22	Alves Ribeiro - Betuminosos:21	
23		Execução de calçadas	2 dias	Qui 07/07/22	Sex 08/07/22	Alves Ribeiro - Calçadas	21
24		<b>Envolvente ao Mercado de Arroios</b>	<b>4 dias</b>	<b>Qui 07/07/22</b>	<b>Ter 12/07/22</b>		
25		Demolição da ilha na Rua Carlos Mardel	1 dia	Qui 07/07/22	Qui 07/07/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	21
26		Pavimentação em betuminoso	1 dia	Sex 08/07/22	Sex 08/07/22	Alves Ribeiro - Betuminosos:25	
27		Pintura da passagem de peões	1 dia	Ter 12/07/22	Ter 12/07/22	Viamarca	26CI+1 dia
28		<b>Troço 8 - AAR # Rua Eduardo Brasão (separador central)</b>	<b>10 dias</b>	<b>Sex 08/07/22</b>	<b>Qui 21/07/22</b>		
29		Demolição da ilha	3 dias	Sex 08/07/22	Ter 12/07/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	25
30		Execução do novo lancil	4 dias	Qua 13/07/22	Seg 18/07/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	29
31		Pavimentação com calçada	3 dias	Ter 19/07/22	Qui 21/07/22	Alves Ribeiro - Betuminosos:30	
32		<b>Troço 7 - AAR # Rua José Falcão</b>	<b>5,5 dias</b>	<b>Qua 13/07/22</b>	<b>Qua 20/07/22</b>		
33		Execução de maciço SLAT e vala	1 dia	Qua 13/07/22	Qua 13/07/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	29
34		Execução da nova ilha	2 dias	Qui 14/07/22	Sex 15/07/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	33
35		Montagem de equipamentos SLAT	1 dia	Qui 14/07/22	Qui 14/07/22	Soltráfego	33
36		Demolição da ilha existente	2 dias	Sex 15/07/22	Seg 18/07/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	35
37		Pavimentação em betuminoso	1 dia	Ter 19/07/22	Ter 19/07/22	Alves Ribeiro - Betuminosos:36	
38		Execução de calçadas	0,5 dias	Seg 18/07/22	Seg 18/07/22	Alves Ribeiro - Calçadas	34
39		Pré-marcações	0,5 dias	Qua 20/07/22	Qua 20/07/22	Viamarca	37
40		<b>Troço 7 - Troço 7 - Praça do Chile (ilha)</b>	<b>3 dias</b>	<b>Ter 19/07/22</b>	<b>Qui 21/07/22</b>		
41		Demolição do lancil	1 dia	Ter 19/07/22	Ter 19/07/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	36
42		Execução do novo lancil	1 dia	Qua 20/07/22	Qua 20/07/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	41
43		Pavimentação com calçada	1 dia	Qui 21/07/22	Qui 21/07/22	Alves Ribeiro - Calçadas	42



ID	Modo de Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Conclusão	Nomes de Recursos	Predecessoras	18/05/2022	22/05/2022	29/05/2022	05/06/2022	12/06/2022	19/06/2022	26/06/2022	03/07/2022	10/07/2022	17/07/2022	24/07/2022	31/07/2022	07/08/2022	14/08/2022	21/08/2022	28/08/2022	04/09/2022	11/09/2022	18/09/2022	25/09/2022
44		Pavimentação em betuminoso	1 dia	Qui 21/07/22	Qui 21/07/22	Alves Ribeiro - Betuminoso:42																					
45		Troço 1 - Martim Moniz	22,5 dias	Qua 20/07/22	Seg 22/08/22																						
46		Pintar 30+bici (ascen + desc) - sinalização provisória	1 dia	Qua 20/07/22	Qua 20/07/22	Viamarca	47II-1 dia																				
47		Demolição do separador	6 dias	Qui 21/07/22	Qui 28/07/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	42																				
48		Execução da nova ilha	10 dias	Qua 27/07/22	Ter 09/08/22	Alves Ribeiro - Equipa 1	47CI-2 dias																				
49		Pavimentação em betuminoso	2 dias	Qua 10/08/22	Qui 11/08/22	Alves Ribeiro - Betuminoso:48																					
50		Execução de calçadas	5 dias	Qua 10/08/22	Qua 17/08/22	Alves Ribeiro - Calçadas	48																				
51		Pré-marcações	0,5 dias	Sex 12/08/22	Sex 12/08/22	Viamarca	49																				
52		Pintura buffer e atravessamento	2 dias	Sex 12/08/22	Qua 17/08/22	Viamarca	51																				
53		Relocalização segregadores - sentido descendente	3 dias	Qua 17/08/22	Seg 22/08/22	Viamarca	52																				
54		Pintura verde da nova ciclovia	21 dias	Qua 27/07/22	Sex 26/08/22	Viamarca	52CC+7 dias																				
55		Colocação de nova SV em toda a zona de intervenção - Deixar tapada	14 dias	Seg 20/06/22	Qui 07/07/22	Viamarca																					
56		<b>FASE 3</b>	<b>33,5 dias</b>	<b>Seg 11/07/22</b>	<b>Sex 26/08/22</b>																						
57		Mudança de sentidos junto ao Mercado de Arroios	33,5 dias	Seg 11/07/22	Sex 26/08/22		7;19																				
58		Levantamento de estacionamento Rua Carlos Mardel (Norte)	2 dias	Seg 11/07/22	Ter 12/07/22	Polícia Municipal;Viamarca																					
59		Apagar lugares de estacionamento na envolvente ao Mercado - Rua Carlos Mardel (norte)	1 dia	Qua 13/07/22	Qua 13/07/22	Viamarca	58																				
60		Levantamento de estacionamento Rua Carlos Mardel (sul)	2 dias	Qui 14/07/22	Sex 15/07/22	Polícia Municipal;Viamarca	59																				
61		Apagar lugares de estacionamento na envolvente ao Mercado - Rua Carlos Mardel (sul)	1 dia	Seg 18/07/22	Seg 18/07/22	Viamarca	60																				
62		Apagar SH na envolvente ao Mercado	2 dias	Seg 11/07/22	Ter 12/07/22	Viamarca	58II																				
63		SLAT na Rosa Damasceno	2 dias	Seg 11/07/22	Ter 12/07/22	Soltráfego	58II																				
64		Pintura dos encabeçamentos raiaados (raios de inserção na Carlos Mardel) - CARRIS	3 dias	Seg 18/07/22	Qua 20/07/22	Viamarca	58;60																				
65		Tapar coluna na Rua Eduardo Brásão - e colocar PMP's na viragem	0 dias	Sex 26/08/22	Sex 26/08/22	Viamarca	66II																				
66		MARCO - Mudança de sentidos	0 dias	Sex 26/08/22	Sex 26/08/22		2;5																				
67		MARCO - ENTRADA EM FUNCIONAMENTO DO NOVO TRAÇADO DA CICLOVIA	0 dias	Sex 26/08/22	Sex 26/08/22		66																				
68		Trabalhos complementares na AAR e arruamentos adjacentes	23 dias	Sex 26/08/22	Qua 28/09/22																						
69		<b>FASE 4</b>	<b>23 dias</b>	<b>Sex 26/08/22</b>	<b>Qua 28/09/22</b>																						
70		Relocalização segregadores - sentido ascendente para descendente	20 dias	Seg 29/08/22	Seg 26/09/22		67II+1 dia																				
71		Remoção da ciclovia atual - ascendente	3 dias	Sex 23/09/22	Qua 28/09/22		70CI-1 dia																				
72		Troço 8 - AAR # Rua Eduardo Brásão	2 dias	Sex 26/08/22	Ter 30/08/22																						
73		Demolição da ilha	1 dia	Sex 26/08/22	Seg 29/08/22		66																				
74		Pavimentação em betuminoso	1 dia	Seg 29/08/22	Ter 30/08/22		73																				
75		Pintar o raiaado no separador central	1 dia	Qui 01/09/22	Sex 02/09/22	Viamarca	65II;74CI+2 dias																				
76		Pintar nova SH (novos sentidos) na envolvente ao Mercado	2 dias	Sex 26/08/22	Ter 30/08/22	Viamarca	66																				
77		Pintura novos lugares de estacionamento na envolvente ao Mercado - Rua Carlos Mardel (norte)	2 dias	Ter 30/08/22	Qui 01/09/22	Viamarca	76																				
78		Pintura novos lugares de estacionamento na envolvente ao Mercado - Rua Carlos Mardel (sul)	2 dias	Qui 01/09/22	Seg 05/09/22	Viamarca	77																				
79		Execução de sinalização horizontal - AAR (30+Pre-marks+setas+eixos)	14 dias	Sex 26/08/22	Qui 15/09/22	Viamarca	66																				

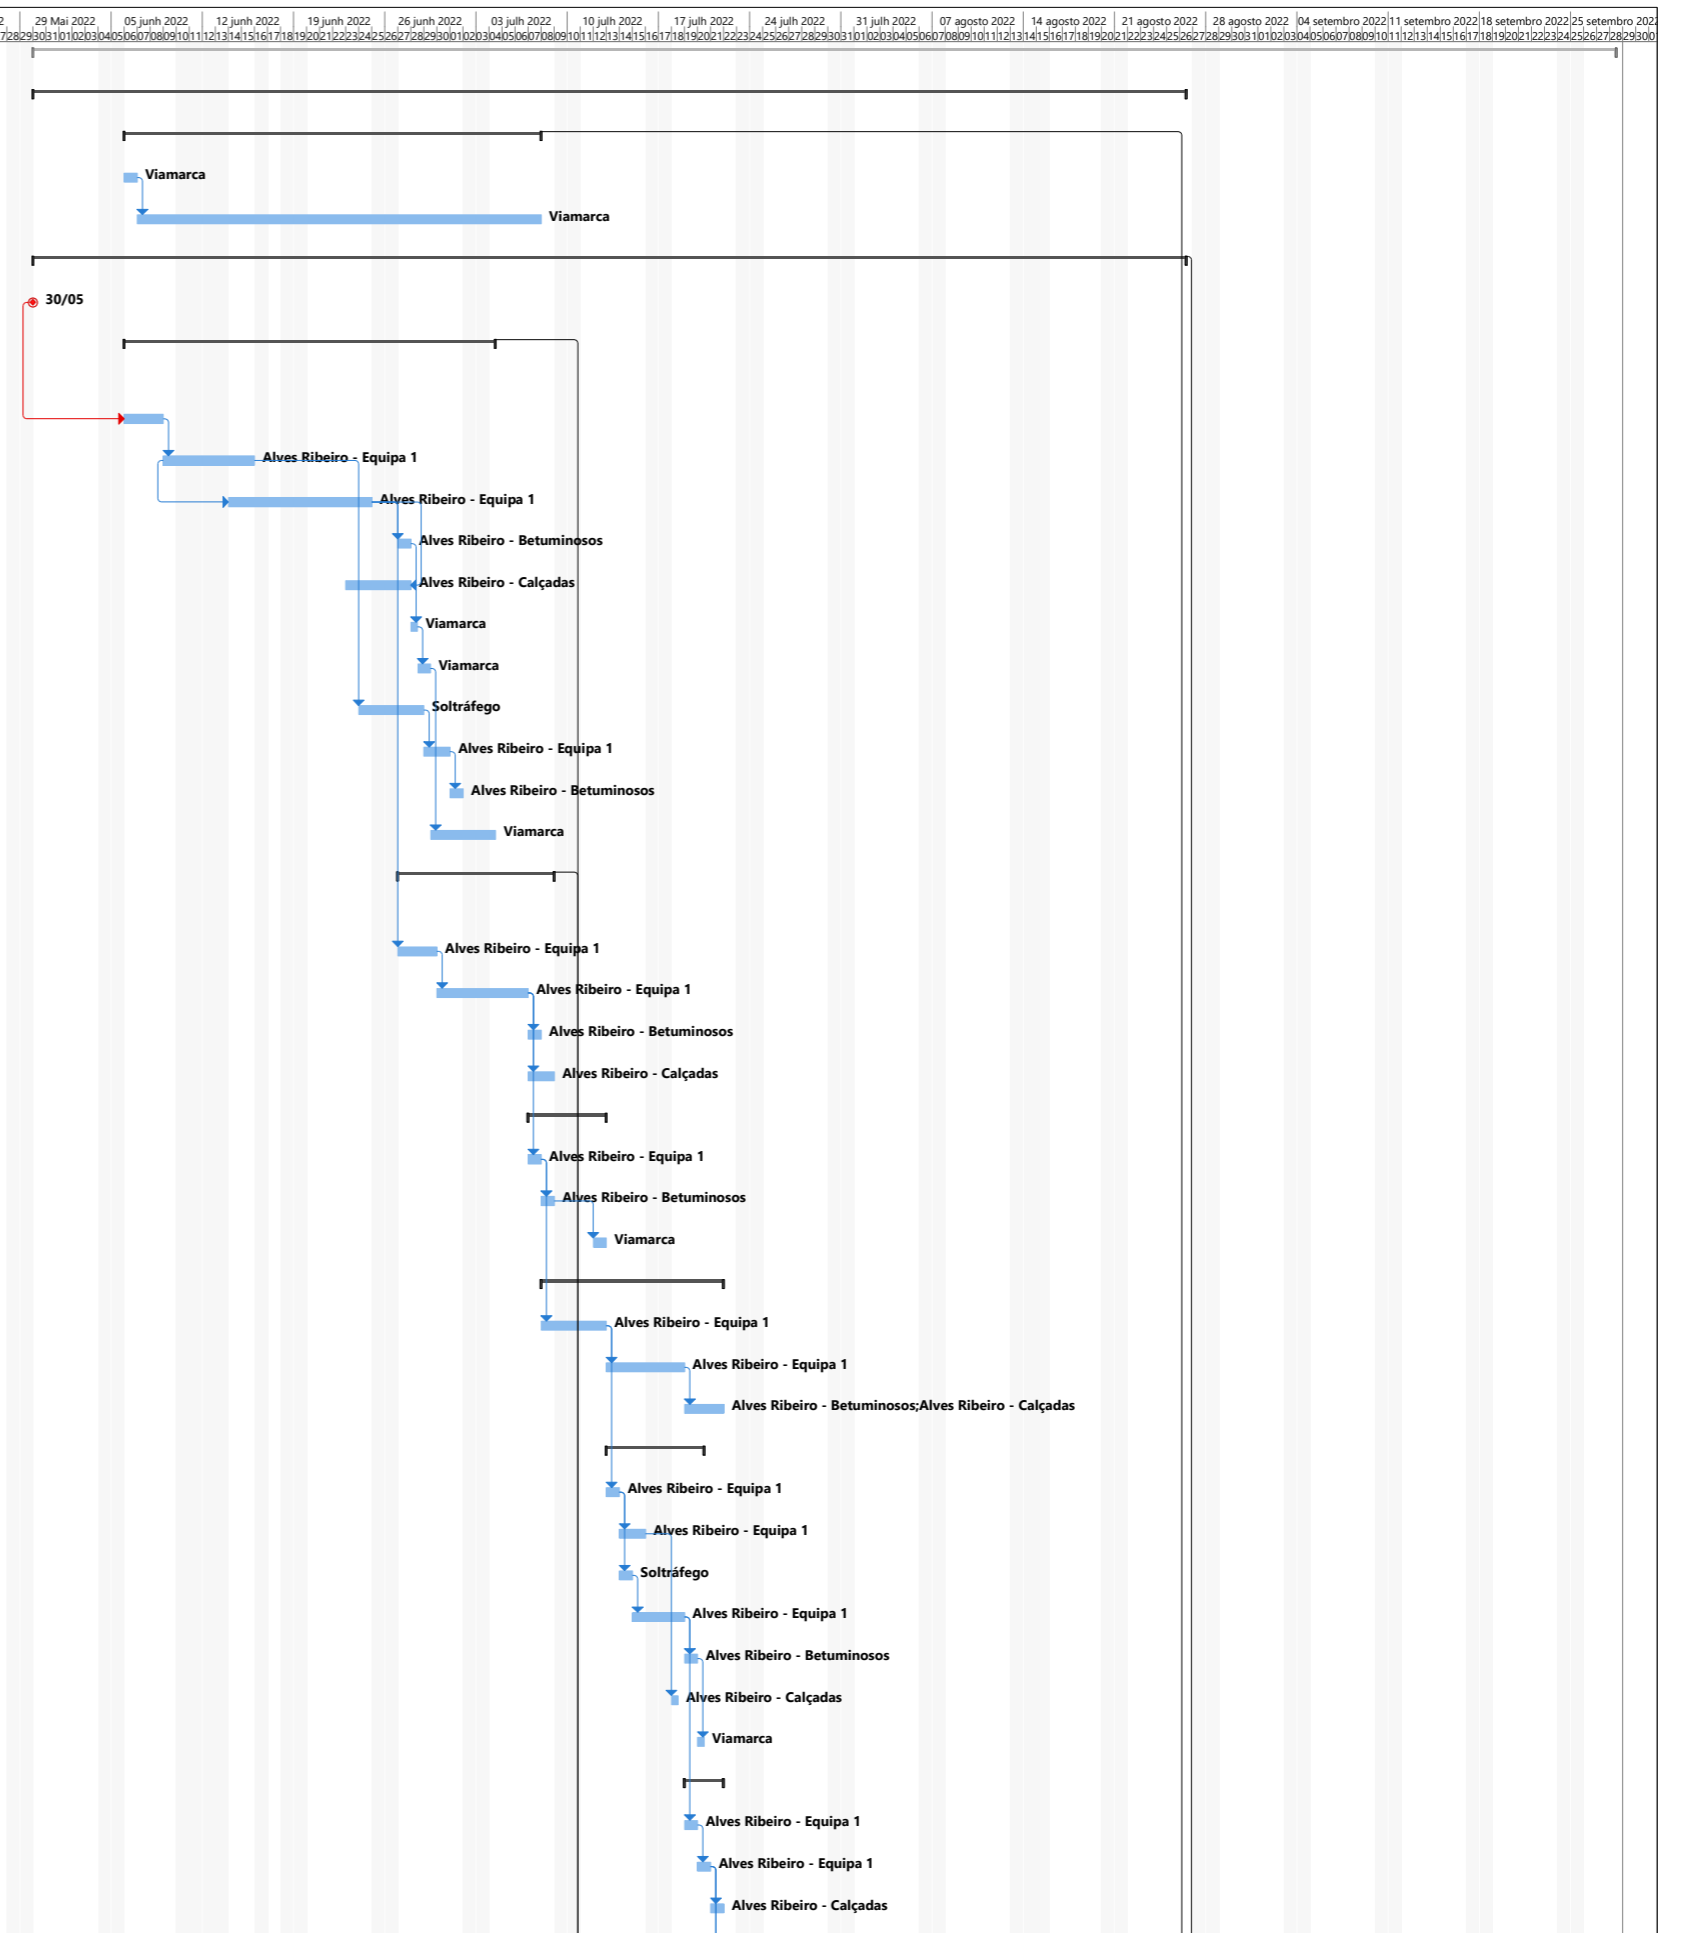
